

Etablering av nye biblioteklokaler

The image shows a modern library interior. A large glass wall in the foreground features the word "BIBLIOTEK" in large, white, 3D letters. Behind the glass, several black chairs are arranged in a circle. In the background, a staircase with a metal railing is visible. The overall atmosphere is bright and contemporary.

NFF Høstseminar, Trondheim 20.10.2016

Karen Johanne Buset NTNU BMH

2003: Nytt medisinsk bibliotek

- Oppdrag fra DMF:
 - Planlegg nytt bibliotek for DMF og St. Olavs Hospital
- Utfordring:
 - Se ti år fram i tid
- Resultat 2004:
 - Funksjonsbeskrivelse
 - Romfunksjonsprogram



Læringspunkter

- Brukerinvolvering
- Fleksibilitet
- Tall og statistikk er viktig

- Implementering i eksisterende lokaler

2009: Tilbake til start: Oppdrag fra KD

- Slå sammen tre eksisterende bibliotek
 - “...ett *felles integrert helsefaglig bibliotek* for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital HF, og ikke to fagbibliotek plassert side om side”
 - “...en samling av *kompetanse* og *ressurser* i et *moderne bibliotek for forskning, læring og formidling*, vil kunne møte *brukernes behov* på en god måte”
- Nytt romfunksjonsprogram
- Implementere læringspunkter

Brukerinvolvering: Tilgjengelighet, fleksibilitet og kompetanse

- Basert på resultater fra brukerundersøkelser
- Fokusgruppeundersøkelse om brukernes ønsker og forventninger til det nye biblioteket
(Sentio Research Norge, 2012)



2012: Bibliotek for medisin og helse

- Tre parallelle løp fram mot innflytting
 - Byggeprosjekt
 - IKT-prosjekt
 - Bibliotekutviklingsprosjekt

- Utfordringer
 - En liten del av et stort sykehusprosjekt
 - Bred involvering i en kompleks prosjektorganisering
 - To organisasjoner med egen infrastruktur i ett lokale

Læringspunkter

- Tett kontakt med alle involverte
- Forhold til arkitekt og innkjøpere – utfordring: hvordan få dem til å forstå bibliotek?
- Delta der man blir invitert
- Lær faguttrykk
- Bli kompis med «byggerne»
- Gå på bygget
- Flytt inn så tidlig som mulig



2013: Innflytting og oppstart


- Flytteplaner og flytteprosess
- Bli kjent i nye lokaler og med felles rutiner
- Fest og frustrasjon

- Beredskap
 - IT
 - Feilretting
- Overraskelsene
 - Det som ikke fungerer
 - Det som ikke ble som vi tenkte



Læringspunkter

- Det blir aldri nok stikkontakter
- Møblene er ikke der studentene vil sitte
- Tunge møbler
- Bruk av grupperom
- Noen vil ha det stille – helt stille
- Vann inn og vann ut
- Inneklima
- Orakel = problemfri IKT

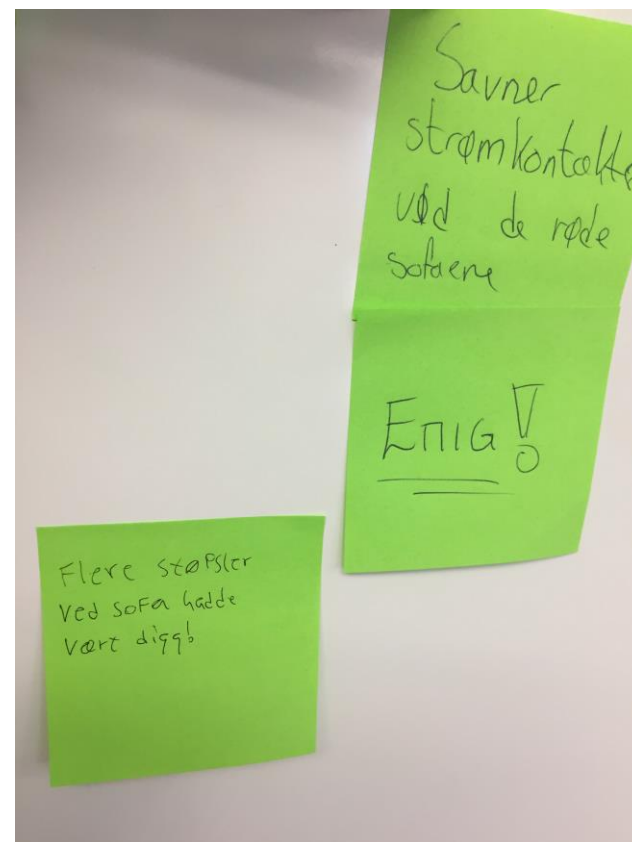

Fakta om BMH

- 1500 kvm netto over to etasjer
- 55 timer åpent pr uke (grupperom 24/7)
- 300 varierte arbeidsplasser
- 12 grupperom
- 35 PC-arbeidsplasser, trådløst nett
- Areal for arrangement og utstillinger
- Ca 3000 studenter og 11000 ansatte fra NTNU (inkludert tidligere HiST) og St. Olavs Hospital
- 16 ansatte, 8 studentvakter, IT-Orakel

Etterpå: Rom for ny kunnskap

- Suksess?
 - Økt aktivitet på alle fronter
 - Fagsnack og andre arrangement
 - Utstillinger, markedsføring, sosiale media, deltakelse, involvering

- Hva kunne vi ha gjort annerledes?





Takk for meg!

karen.buset@ub.ntnu.no

<http://www.ntnu.no/ub/bibliotek/bmh>
